



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

FORMATO: IC-02



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		% DE AVANCE		
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIE RO
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
RECURSOS PROPIOS										
OBRAS EN PROCESO										
	RP/03/2018	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 2,895,217.52	CONTRATO	AJORCA INTERIORES Y EXTERIORES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE-RP 03/2018	\$ 2,895,217.52	\$ 2,616,825.91	95.00%	90.38%
TOTAL			\$ 2,895,217.52				\$ 2,895,217.52	\$ 2,616,825.91		
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
RECURSOS FISCALES										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
	RF-001-2021	INTERVENCIÓN A BASE DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN MUROS, COLUMNAS EN ACCESOS Y RESTAURACIÓN EN SANITARIOS DEL PANTEÓN SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 2,485,552.61	CONTRATO	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V	SPLOP/IRE/RF 001/2021	\$ 2,485,374.92	\$ 2,067,364.99	100.00%	83.18%
	RF-002-2021	REFORZAMIENTO DEL TECHADO EN AREA DE BODEGA DE FRUTAS DEL MERCADO DE ABASTO.	\$ 5,680,058.12	CONTRATO	ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/RF 002/2021	\$ 5,678,436.20	\$ 5,678,436.20	100.00%	100.00%
	RF-003-2021	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA	\$ 584,000.00	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RF 003/2021	\$ 583,015.85	\$ 583,015.85	100.00%	100.00%
	RF-004-2021	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 960,000.00	CONTRATO	CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RF 004/2021	\$ 959,031.57	\$ 914,004.59	100.00%	95.30%
	RF-005-2021	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN PLAZUELA DEL MERCADO ZONAL LA CASCADA.	\$ 240,946.87	CONTRATO	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RF 005/2021	\$ 240,032.23	\$ -	100.00%	0.00%
TOTAL			\$ 9,950,557.62				\$ 9,945,890.77	\$ 9,242,821.63		
RAMO 33 FONDO III										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
	FII/004/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS BRISAS Y CALLE PLAYA DEL CARMEN, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES PARTE NORTE, AGENCIA DONAJI.	\$ 2,395,586.71	CONTRATO	MÁXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	SPLOP/FII 004/2021	\$ 2,395,586.71	\$ 2,395,586.71	100.00%	100.00%
	FII/014/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES DE TIERRA Y LIBERTAD Y LOMA DE GUADALUPE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 3,598,205.89	CONTRATO	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	SPLOP/FII 014/2021	\$ 3,598,205.89	\$ 3,598,205.89	100.00%	100.00%
	FII/017/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE (EMILIO PORTES GIL), COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 1,146,312.56	CONTRATO	MÁXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	SPLOP/FII 017/2021	\$ 1,146,312.56	\$ 1,146,312.56	100.00%	100.00%
	FII/029/2021	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA LOS SABINOS, AGENCIA CANDIANI.	\$ 3,194,363.14	CONTRATO	INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FII 029/2021	\$ 3,194,363.14	\$ 3,194,363.14	100.00%	100.00%
	FII/055/2021	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL ESTANQUE DE REBOMBEO AL ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO, COLONIA AURORA SECTOR 1, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 2,905,126.78	CONTRATO	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C., S.A. DE C.V.	SPLOP/FII 055/2021	\$ 2,905,126.78	\$ 2,905,126.78	100.00%	100.00%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

FORMATO: IC-02



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		% DE AVANCE		
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIE RO
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	FIII/062/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE LA CRUZ, PARAJE LA CRUZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 1,511,511.70	CONTRATO	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 062/2021	\$ 1,511,511.70	\$ 1,511,511.70	100.00%	100.00%
	FIII/063/2020	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE COLON ENTRONQUE CON CALLE HIDALGO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 1,962,172.28	CONTRATO	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 063/2021	\$ 2,015,900.66	\$ 1,962,172.28	100.00%	100.00%
	FIII/069/2021	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CALLE AMAPOLAS, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 6,030,871.46	CONTRATO	MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA S.A DE C.V.	SPLOP/FIII 069/2021	\$ 6,030,871.46	\$ 6,030,871.46	100.00%	100.00%
	FIII/077/2021	REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN MILLAN, CLAVE 20DJND112Y, AGENCIA DE DOLORES.	\$ 215,930.83	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ULTIMATE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 077/2021	\$ 250,175.02	\$ 215,930.83	100.00%	100.00%
	FIII/078/2021	AMPLIACION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 20DPR1647F, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 252,502.57	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ULTIMATE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 078/2021	\$ 259,569.49	\$ 252,502.57	100.00%	100.00%
	FIII/079/2021	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIVISION DEL NORTE, COLONIA SANTA MARIA DEL MARQUESADO, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 309,598.28	CONTRATO	GRUPO CONSTRUCTOR ULTIMATE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 079/2021	\$ 312,643.94	\$ 309,598.28	100.00%	100.00%
	FIII/084/2021	REHABILITACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL, INFONAVIT PRIMERO DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 1,344,924.47	CONTRATO	CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 084/2021	\$ 1,366,799.21	\$ 1,344,924.47	100.00%	100.00%
	FIII/087/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, SECTOR 3, LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 3,362,644.74	CONTRATO	MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA S.A DE C.V.	SPLOP/FIII 087/2021	\$ 3,362,644.74	\$ 3,362,644.74	100.00%	100.00%
	FIII/088/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CEDROS, SECTOR 2, SEGUNDA SECCION, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 1,204,579.23	CONTRATO	INFRAESTRUCTURAS 627,S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 088/2021	\$ 1,204,579.23	\$ 1,204,579.23	100.00%	100.00%
	FIII/090/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN CABRERA LIRA, ENTRE EL PUENTE Y UNIDAD OBRERA, COLONIA MARTIRES DE RIO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 2,567,488.15	CONTRATO	CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 090/2021	\$ 2,567,488.15	\$ 2,567,488.15	100.00%	100.00%
	FIII/095/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE LAGO DE TEXCOCO, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 2,748,465.12	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 095/2021	\$ 2,748,465.12	\$ 2,748,465.12	100.00%	100.00%
	FIII/103/2021	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAGO DE TEXCOCO, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 666,212.20	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 103/2021	\$ 666,212.20	\$ 666,212.20	100.00%	100.00%
	FIII/104/2021	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGO DE TEXCOCO, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 905,384.01	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA, S.A. DE C.V.	SPLOP/FIII 104/2021	\$ 905,384.01	\$ 905,384.01	100.00%	100.00%
	FIII/107/2021	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMAPOLAS, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 1,621,146.56	CONTRATO	MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA S.A DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 107/2021	\$ 1,621,146.56	\$ 1,621,146.56	100.00%	100.00%
	FIII/110/2021	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMAPOLAS, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 711,212.30	CONTRATO	MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA S.A DE C.V.	SPLOP/AD/FIII 110/2021	\$ 711,212.30	\$ 711,212.30	100.00%	100.00%



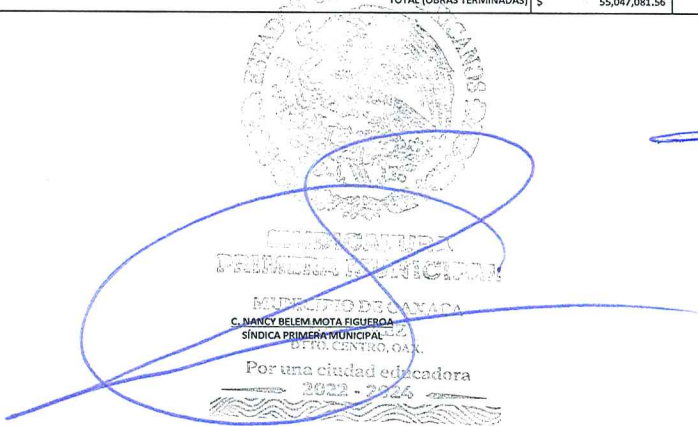
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022


FORMATO: IC-02



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		% DE AVANCE		
						NÚM.	IMPORTE	IMPORTE PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	FII/114/2021	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL ANDADOR DEL SOL, COMUNICANDO A LA CALLE DEL AVIÓN Y AV. JORGE L. TAMAYO, AGENCIA CANDIANI.	\$ 233,392.65	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/114/2021	\$ 233,392.65	\$ 233,392.65	100.00%	100.00%
	FII/115/2021	REHABILITACIÓN DE LOSA CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR DEL SOL ENTRE PRIVADA DEL SOL Y MARTIRES DE TACUBAYA, AGENCIA CANDIANI.	\$ 6,208,892.31	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FII/115/2021	\$ 6,208,892.31	\$ 6,208,892.31	100.00%	100.00%
TOTAL			\$ 45,096,523.94				\$ 45,216,483.83	\$ 45,096,523.94		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$ 2,895,217.52				\$ 2,895,217.52	\$ 2,616,825.91		
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$ 55,047,081.56				\$ 55,162,374.60	\$ 54,339,345.57		


C. NANCY BELEM MOTA FIGUEROLA
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL
DISTRITO CENTRO, OAX.
Por una ciudad educadora
2022 - 2024


C. FRANCISCO MARTÍNEZ NERI
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipio de Oaxaca de Juárez
Dfno. Centro, Oax.
Por una ciudad educadora
2022 - 2024

C. JORGE CASTRO CAMPOS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL


C. JUDITH CARRERO HERNÁNDEZ
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
Municipio de Oaxaca de Juárez
Dfno. Centro, Oax.
Por una ciudad educadora
2022 - 2024


C. LETICIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
Municipio de Oaxaca de Juárez
Dfno. Centro, Oax.
Por una ciudad educadora
2022 - 2024
