



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SPLOP/FIII 029/2021

<p>Contratista: "Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Binlua, S.A. de C.V." Administrador General Único: C. Pedro Rolando López Alavéz Domicilio: Calle Narciso Mendoza No. 108, Jalatlaco, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68080. Teléfono: 951-161-27-19 / 951-518-18-58 R.F.C.: IDD101220187 I.M.S.S: D68 56009 10 7</p>	<p>Modalidad de Adjudicación: Licitación Pública Estatal No. de Convocatoria: 003 Fecha de Convocatoria: 29 de Julio del 2021. No. de Licitación: LPE/SPLOP/016/2021 Fecha de Fallo: 18 de Agosto del 2021. Fuente de Financiamiento: Ramo General 33 / Fondo III Ejercicio Fiscal: 2021.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>No. de Obra: FIII/029/2021</p>	
<p>Obra: "Repavimentación con concreto hidráulico en la Avenida los Sabinos, Agencia Candiani."</p>	
<p>Municipio: Oaxaca de Juárez</p>	<p>Estado: Oaxaca</p>

<p>Monto: \$ 2'566,787.87 Incluye el I.V.A.</p>	<p>Anticipo: \$ 770,036.36 Incluye el I.V.A.</p>
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------

<p>Plazo de Ejecución: 60 Días Naturales</p>

<p>Inicio: 25 de Agosto del 2021</p>	<p>Termino: 23 de Octubre del 2021</p>
------------------------------------------	--------------------------------------------

<p>Fecha de Contrato: 24 de Agosto del 2021</p>



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SPLOP/FIII 029/2021

ÍNDICE

Declaraciones:

- I.- Del Municipio
- II.- Del Contratista

Cláusulas:

Primera.-	Objeto
Segunda.-	Monto del Contrato
Tercera.-	Plazo de ejecución
Cuarta.-	Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos
Quinta.-	De los anticipos
Sexta.-	Forma de pago
Séptima.-	Lugar de pago
Octava.-	Garantías
Novena.-	Ajuste de costos
Décima.-	Subcontratación y cesión de derechos de cobro
Décima Primera.-	Recepción de los trabajos
Décima Segunda.-	Representante del contratista
Décima Tercera.-	Relaciones laborales
Décima Cuarta.-	Responsabilidades del contratista
Décima Quinta.-	Penas convencionales y retenciones
Décima Sexta.-	Suspensión temporal del contrato
Décima Séptima.-	De la terminación anticipada del contrato
Décima Octava.-	Rescisión administrativa del contrato
Décima Novena.-	Modificaciones
Vigésima.-	Normatividad aplicable
Vigésima Primera.-	Jurisdicción y tribunales competentes

R



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SPLOP/FIII 029/2021

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, **El Municipio** de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por **el Ciudadano Jorge Castro Campos** en su carácter de **Síndico Segundo** y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez, y **el Ciudadano Alberto Ignacio Orozco Pintos**, **Director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente** y como testigos los **Ciudadanos Manuel Alejandro Altamirano Salazar y Gerardo Vásquez Moreno**, con los cargos de **Subdirector de Proyectos y Licitaciones de Obra Pública y Subdirector de Construcción de Obra Pública** de la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este Contrato se le denominará "**El Municipio**", y por la otra parte la empresa denominada "**Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Binlua, S.A. de C.V.**" representada en este acto por **el Ciudadano Pedro Rolando López Alavéz**, en su carácter de **Administrador General Único** a quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se le denominará "**El Contratista**", mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de las siguientes Declaraciones y Cláusulas:

DECLARACIONES:

I.- "El Municipio", Declara:

I.1.- Ser una Entidad de Derecho Público con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, Autónomo en su régimen interior y con la libre administración de su hacienda pública municipal, con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2º de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y 2º del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Cuenta con un órgano administrativo de apoyo denominado "**Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez**" en términos de lo establecido en los artículos 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y 53 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez vigente.

I.2.- Está facultado para obligarse y comprometerse en los términos del presente contrato, de acuerdo a lo previsto en los artículos 71 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y 55 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez; acreditando su personalidad **el Ciudadano Jorge Castro Campos** en su carácter de **Síndico Segundo** y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez, con el Acta de Sesión Solemne de Cabildo celebrada por el Honorable Cabildo Municipal el día **Uno de Enero del año Dos Mil Diecinueve**.

I.3.- Sujetarse a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y 170 Fracción III del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez, en todo lo relativo al presente contrato se auxiliará del Subdirector de Proyectos y Licitaciones de Obra Pública, quien acredita su personalidad con el nombramiento expedido por el Presidente Municipal y en lo conducente se entenderá con el "**El Contratista**".

I.4.- Tiene como base para la elaboración de este Contrato, la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca** y atendiendo a lo establecido por el **Acuerdo** emitido por el **Presidente Municipal Constitucional** en el que establece, la integración, atribuciones, obligaciones y operación del "**Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez**", para el **Período 2019-2021**, publicado en la **Gaceta Municipal número 07** correspondiente al mes de **Julio** del año **Dos Mil Diecinueve**, por el que se faculta a diversos Servidores Públicos de la Administración Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, para que en forma colegiada a través del "**Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez**", determinen los procedimientos para la contratación y ejecución de la obra pública y servicios relacionados con las mismas, que ejecute el Municipio de Oaxaca de Juárez.



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SPLOP/FIII 029/2021

I.5.- La adjudicación del presente Contrato, se realiza con fundamento en lo dispuesto en los **Artículos 24, 25 Fracción I, y 28 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, y con la finalidad de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, el "**Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez**" aprobó el procedimiento de contratación por Licitación Pública, según consta en el **acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Ejercicio Fiscal 2021** celebrada el día **13 de Julio del 2021** y el Acuerdo número: **COP/033/2021** para lo cual la Subdirección de Proyectos y Licitaciones de Obra Pública llevó a cabo la **Licitación Pública Estatal** número **LPE/SPLOP/016/2021** que fue adjudicada a la Empresa "**Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Binlua, S.A. de C.V.**" mediante fallo emitido con fecha **18 de Agosto del 2021**.

I.6.- Las erogaciones que se generen como consecuencia de la ejecución de los trabajos objeto del presente Contrato, se cubrirán con **Recursos provenientes del Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios para el Ejercicio Fiscal 2021, asignados a este Municipio correspondientes al Fondo III, "Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal"**, según Oficio de Aprobación del Ejercicio de los Recursos número **FISMDF/029/2021** de fecha **18 de Junio del 2021**, signado por la **C. Martha Patricia Toledo Hernández** en su carácter de **Tesorera Municipal**, correspondiéndole el número de Obra: **FIII/029/2021 Finalidad 2 Desarrollo Social Función 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad** y Subfunción **2.2.1 Urbanización**, afectando la Clave Presupuestal número **31111203102211210500105K1216141222533321**.

I.7.- Tiene establecido su Domicilio Legal para los efectos del presente Contrato, el ubicado en Plaza de la Danza sin número, en el edificio bien conocido que ocupa el Palacio Municipal de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el Centro Histórico de ésta Ciudad, C.P. 68000, manifestando que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número **MOJ7210102H1**.

II.- "El Contratista", Declara:

Ser una **Sociedad Anónima de Capital Variable** que se rige por:

II.1.- Acta Constitutiva número **3338** Volumen número **XLII**, de fecha de acta **08 de Diciembre del 2010**, pasada ante la **Fe del Notario Público** número **Díez, Lic. Jorge Martínez Vigil**, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, e inscrita en el **Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Oaxaca**, bajo el folio mercantil electrónico número **22290 * 1** de fecha de registro **31 de Enero del 2011**, del Estado de Oaxaca.

II.2.- Su objeto social es **Proyectar, contratar y construir obras públicas con el Gobierno Federal, Estatal y Municipal así como privadas con particulares tales como industriales, de oficinas, habitacionales, eléctricas, agrícolas, marítimas, pluviales, lacustres, perforación de pozos, presas y canalización de aguas, puertos y aeropuertos, así como instalaciones y construcciones conexos, apertura y/o mejoramiento de caminos, carreteras, vías férreas, puentes, obras viales de drenaje, redes de distribución, servicios de agua potable y en general toda clase de obras de urbanización, lo anterior queda señalado de manera simplemente enunciativa pero no limitativa, de tal suerte que éste renglón de objeto comprende de la manera más amplia y sin limitación toda clase de obras, construcciones y servicios de ingeniería y arquitectura.**

II.3.- El Ciudadano **Pedro Rolando López Alavéz** acredita su Personalidad como **Administrador General Único** de la Empresa "**Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Binlua, S.A. de C.V.**" con el Instrumento Notarial número **3338**, Volumen número **XLII**, de fecha **08 de Diciembre del 2010**, pasada ante la **Fe del Notario Público** número **Díez, Lic. Jorge Martínez Vigil**, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, e inscrita en el **Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Oaxaca**, bajo el folio mercantil electrónico número **22290 * 1** de fecha de



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SPLOP/FIII 029/2021

registro **31 de Enero del 2011, del Estado de Oaxaca**; Personalidad que a la fecha no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna.

II.4.- Acredita su identidad el Ciudadano **Pedro Rolando López Alavéz** en este acto con su **Credencial para Votar con fotografía con folio número 0549064442786** expedida por el Instituto Nacional Electoral.

II.5.- El Ciudadano **Pedro Rolando López Alavéz** en su carácter de **Administrador General Único**, declara bajo protesta de decir verdad, que tanto la Empresa que representa, así como sus socios o las personas que la integran no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos en el **artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.

II.6.- Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne asimismo, las condiciones técnicas y económicas para obligarse a ejecutar la obra objeto de este contrato.

II.7.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, además de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el **Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación**.

II.8.- Su representada cuenta con los registros que se citan a continuación, los cuales se encuentran vigentes:

a).- Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público número **IDD101220187** sin adeudo alguno por concepto de Impuesto Federal, Estatal o Municipal.

b).- Cuenta con el Registro Patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social número **D68 56009 10 7** sin adeudo por obligaciones patronales, ni sanción alguna.

II.9.- Tiene establecido su Domicilio Fiscal en **Calle Narciso Mendoza No. 108, Jalatlaco, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68080**, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II.10.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, y demás disposiciones administrativas aplicables en materia de obra pública, del proyecto ejecutivo conformado por los proyectos arquitectónicos y/o de ingeniería las especificaciones generales y particulares de construcción, las normas de calidad, los programas, el presupuesto y la bitácora de obra que integran el presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.

"Las Partes" se reconocen recíprocamente la personalidad con la que se ostentan y han convenido en celebrar el presente contrato, al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.

El objeto del presente Contrato, consiste en establecer las bases, términos y condiciones, sobre las cuales "El Municipio", encomienda a "El Contratista", la ejecución de los trabajos de la Obra Pública denominada: **"Repavimentación con concreto hidráulico en la Avenida los Sabinos, Agencia Candiani."** En el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro. Consistente en los siguientes trabajos: **Limpieza, trazo y nivelación del terreno, demolición de concreto hidráulico, corte en caja sobre base hidráulica o sub base hidráulica, afine y compactación del terreno natural, construcción de base para pavimento, concreto hidráulico para losa de pavimento con espesor de 15 cms, renivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.50 mts. arriba del nivel original, renivelación de rejilla pluvial de 6.00 x 1.00 m. a base de perfil ipr, de 0.25 a 0.50 mts arriba del**



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SPLOP/FIII 029/2021

nivel del terreno, suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales color amarillo tráfico, limpieza general de la obra a mano, acarreo en camión volteo fuera de la obra. Misma que incluye las siguientes Partidas: **Preliminares, Cortes y Afines, Pavimento, Renivelaciones, Pintura y Limpieza y Acarreos.** Obligándose "El Contratista" a realizarla hasta su total terminación de acuerdo con el proyecto ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por "El Contratista" y acta de junta de aclaraciones aprobados por "El Municipio" y **que forman parte integral del contrato**, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el punto **II.10** del capítulo de declaraciones de este Contrato, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deberán realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato, así como las demás disposiciones en materias de asentamientos humanos, desarrollo urbano y medio ambiente.

El proyecto ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por "El Contratista" y acta de junta de aclaraciones aprobados por "El Municipio", a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento; quedando en el entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su observancia será obligatoria.

Segunda.- Monto del Contrato.

El monto total de la obra objeto del presente Contrato es de **\$ 2'566,787.87 (Dos millones quinientos sesenta y seis mil setecientos ochenta y siete pesos 87/100 M.N.)**, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Tercera.- Plazo de Ejecución.

"El Contratista", se obliga a ejecutar la obra en un plazo de: **60** días naturales, fijándose como fecha de inicio de los trabajos el día **25 de Agosto del 2021**, y de terminación el día **23 de Octubre del 2021** de conformidad con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

Cuarta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

"El Municipio", se obliga a poner a disposición de "El Contratista", el o los inmuebles en que se llevarán a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para su realización, con excepción de las que corresponda obtener a "El Contratista", por ser inherentes al objeto de este contrato.

Con fundamento en el **Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, "El Municipio" mediante escrito dirigido a "El Contratista" designará a su representante en la obra, quien fungirá como residente de la misma y que tendrá las facultades y obligaciones del artículo en mención.

Quinta.- De los anticipos.

En los términos del **Artículo 53 de la Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, "El Municipio" otorgará a "El Contratista" un anticipo por la cantidad de **\$ 770,036.36 (Setecientos setenta y seis pesos 36/100 M.N.)**, este monto incluye el Impuesto al Valor Agregado, equivalente al **30 %** del valor de los trabajos objeto de este contrato.

Dicho anticipo deberá ser aplicado por "El Contratista" para realizar en el sitio de la obra, la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SPLOP/FIII 029/2021

adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto de este contrato; **por lo que el "El Contratista" se obliga a presentar la factura para pago dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma de contrato, de no ser presentada en el mencionado término, la demora en el pago será causa imputable al contratista.**

"El Contratista" acepta que la amortización del anticipo pactado en esta cláusula, se sujetará al siguiente procedimiento:

La amortización deberá efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

El porcentaje de cada amortización será el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo entre el importe de la obra.

Para la amortización del anticipo en los casos de rescisión de contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a "El Municipio", en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a "El contratista" la determinación de rescindir el contrato.

Con el objeto de que "El Municipio" compruebe la correcta inversión, exacta amortización o devolución total o parcial del anticipo convenido en esta cláusula, podrá pedir información y practicar revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto el contratista deberá dar a el municipio y a sus representantes, todas las facilidades necesarias, así como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicación del anticipo, con las facturas de los pagos o documentación de cualquier índole que se le requiera.

Sexta.- Forma de pago.

"Las Partes" convienen que los trabajos ejecutados objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarquen periodos no mayores a treinta días naturales, las que serán presentadas por "El Contratista" al residente de la obra, dentro de los **cuatro días hábiles siguientes** a la fecha de corte, para la validación y revisión de las mismas, debidamente soportada con la documentación que acredite su pago para la revisión de la misma, cuando en las estimaciones existieren diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolverán y en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación, para que "El Municipio", inicie su trámite de pago.

Tratándose de pagos en exceso, "El Contratista", deberá reintegrar las cantidades recibidas en exceso, más los intereses correspondientes conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales y se computarán por días calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "El Municipio". De conformidad con lo dispuesto por el **Artículo 56 Fracción IV Penúltimo Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.**

No serán consideradas como pago en exceso, las diferencias que resulten a cargo de "El Contratista" que sean compensadas en la siguiente estimación.

"Las Partes" convienen que la estimación que se formule para efectos de finiquito no deberá ser menor del 20% del monto total de los trabajos ejecutados.



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SPLOP/FIII 029/2021

Séptima.- Lugar de Pago.

"Las Partes" convienen en que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones de trabajo que se generen como consecuencia de la obra, objeto del presente contrato serán pagadas por la Tesorería Municipal, ubicada en la Plaza de la Danza sin número, en el edificio bien conocido que ocupa el Palacio Municipal, en el Centro Histórico de esta Ciudad dentro del plazo que establece el **Artículo 56 Fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.

Octava.- Garantías.

Para garantizar el estricto cumplimiento del presente contrato, "El Contratista", se obliga a constituir a favor de la **Tesorería Municipal de Oaxaca de Juárez**; en la forma, términos y procedimientos establecidos por la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, y demás disposiciones administrativas aplicables, las siguientes garantías:

- I. Fianza que garantice por "El Contratista" la correcta inversión, exacta amortización o devolución del anticipo que le sea otorgado por "El Municipio", en los términos de lo dispuesto por el artículo 37 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la cláusula quinta del presente instrumento.

La fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por "El Contratista" a "El Municipio", dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación y otorgada por institución mexicana debidamente autorizada a favor de la **Tesorería Municipal de Oaxaca de Juárez**, con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo incluyendo el impuesto al valor agregado, importe señalado en el primer párrafo de la cláusula quinta.

Cuando "El Contratista" no entregue la garantía del anticipo en el plazo indicado, a entera satisfacción de "El Municipio", no procederá el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos por entrega tardía de este; y por lo tanto "El Contratista" se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la cláusula tercera de este contrato.

- II. Fianza que garantice por "El Contratista", el **cumplimiento** de sus obligaciones derivadas del presente contrato y conforme a lo dispuesto por el artículo **37 fracción II** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, misma que será cancelada una vez que se hayan ejecutado en su totalidad los trabajos objeto del presente contrato y "El Municipio" los reciba a su entera satisfacción.

La fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por "El Contratista" a "El Municipio", dentro de **los 5 (cinco) días hábiles** siguientes, a la fecha de notificación del fallo de adjudicación y otorgada por institución mexicana debidamente autorizada a favor de la **Tesorería Municipal de Oaxaca de Juárez**, con valor del **10% (diez por ciento)** del importe total contratado incluyendo el impuesto al valor agregado de los trabajos objeto de este contrato, importe señalado en la cláusula segunda de este contrato.

La póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "El Contratista" con motivo de este contrato, se cancelará cuando, entre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la garantía de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

- III. Para garantizar los **vicios o defectos ocultos** y de cualquier otra responsabilidad que de ello pudieran derivarse, "El Contratista", se obliga a otorgar al término de la obra, una fianza equivalente al **10%** del monto total ejercido de acuerdo a lo establecido en el **artículo 37 fracción III y el artículo 64** de la **Ley**



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SPLOP/FIII 029/2021

de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, misma que tendrá una vigencia de doce meses, contados a partir de la fecha de la entrega recepción de los trabajos, esta fianza otorgada por institución afianzadora mexicana, deberá exhibirse previo a la recepción formal de la obra, a favor de la Tesorería Municipal de Oaxaca de Juárez.

"El Contratista", se obliga a elaborar en forma conjunta con el residente de obra de "El Municipio", el finiquito de obra correspondiente, mismo que deberá firmarse en un plazo no mayor de veinte días naturales, siguientes a la fecha de la entrega recepción de los trabajos.

Novena.- Ajuste de costos.

"Las Partes" convienen que a partir de la presentación de las propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, revisarán dichos costos en forma conjunta, debiendo observar para tal efecto, el procedimiento que establece el Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

En este supuesto, "El Contratista", dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito su solicitud de ajuste de costos a "El Municipio", debidamente soportada con la documentación que acredite su petición, transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "El Contratista", para reclamar su pago.

Recibida la solicitud de ajuste de costos, "El Municipio", dentro del plazo de treinta días naturales siguientes, resolverá por escrito lo procedente, debiéndolo hacer del conocimiento de "El Contratista".

El ajuste de costos cuando proceda, se calculará a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato, en caso de existir atraso no imputable a "El Contratista", con respecto al programa que se hubiere convenido.

En el supuesto que se presente un atraso en la ejecución de los trabajos sea por causas imputables a "El Contratista", el ajuste de costos procederá únicamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido, en términos de lo dispuesto por el Artículo 55, Fracción I, último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Décima.- Subcontratación y Cesión de derechos de cobro.

"Las Partes" convienen que "El Contratista" no podrá ceder o subcontratar la ejecución de la obra, salvo autorización de "El Municipio" por escrito y en los términos señalados en dicho escrito de autorización, también es cosa convenida entre "El Municipio" y "El Contratista" que únicamente los derechos de cobro podrán cederse previa autorización del Municipio, con fundamento en el artículo 48 de la Ley en la materia, siempre y cuando "El Contratista" ceda los mismos ante fedatario público, acreditando "El Contratista" su personalidad en relación a la obra contratada y conforme al procedimiento de la materia.

Décima Primera.- Recepción de los trabajos.

La recepción de los trabajos, en forma total o parcial, se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen los Artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así como bajo las modalidades que la misma prevé, reservándose "El



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SPLOP/FIII 029/2021

Municipio", el derecho de exigir por cualquier vía que permita la ley, la terminación de los trabajos faltantes o mal ejecutados o hacer efectiva la garantía otorgada para tal efecto.

Al término de los trabajos contratados **"El Contratista"** estará obligado a presentar los planos definitivos de la obra impresos y en formato digital que se consideran en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos de la propuesta presentada.

Una vez finiquitado los trabajos, **"El Contratista"**, se obliga a elaborar en forma conjunta con **"El Municipio"**, el **acta administrativa** de entrega recepción, que dará por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

"El Contratista" que no cumpla con entregar el finiquito, **"El Municipio"** procederá a elaborarlo, comunicando el resultado a **"El Contratista"** dentro de un plazo de **diez días naturales** contados a partir de la emisión del mismo; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a **"El Contratista"**, éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Décima Segunda.- Representante de "El Contratista".

"El Contratista", se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente que actuará como su superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. En este caso, **"El Municipio"**, se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier momento.

El superintendente de construcción designado por **"El Contratista"**, tendrá la obligación de conocer el contrato, el proyecto y las especificaciones técnicas y deberá estar facultado para dirigir la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente contrato, así como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y, en general para actuar a nombre de **"El contratista"**, con las facultades legales suficientes para el cumplimiento de este contrato.

Décima Tercera.- Relaciones Laborales.

"Las Partes" expresamente manifiestan que entre ellas no existe relación laboral de ningún tipo y por ello **"El Contratista"**, como patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de **"El Municipio"**, en relación con los trabajos objeto de este contrato.

Décima Cuarta.- Responsabilidades de "El Contratista".

"El Contratista", se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad y especificaciones técnicas establecidas y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de **"El Municipio"**, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por falta de pericia, inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a **"El Municipio"** o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total.

"El Contratista", será el único responsable de la ejecución de los trabajos, cuando estos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o de acuerdo a las especificaciones que por escrito le proporcione **"El Municipio"**. **"El Contratista"** estará obligado a reparar o reponer de manera inmediata las tomas de agua potable y/o descargas sanitarias que afecte derivado de la ejecución de los trabajos, mismos que correrán por su cuenta.



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SPLOP/FIII 029/2021

"El Contratista", en la ejecución de los trabajos, deberá observar las disposiciones de seguridad que "El Municipio", tenga establecidos en el lugar de ejecución de los trabajos, sujetándose así mismo, a los demás ordenamientos o reglamentos expedidos por las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal. "El Contratista" estará obligado a ubicar en el sitio de ejecución de los trabajos el **letrero nominativo de la obra** que se considera en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos de la propuesta presentada, la cual deberá realizarse conforme a las especificaciones anexas en las bases de la licitación, misma que deberá contener la siguiente leyenda: **"ESTA OBRA SE REALIZÓ CON RECURSOS FEDERALES DEL FAIS DEL EJERCICIO FISCAL 2021"**.

Será responsabilidad de "El Contratista", los daños y perjuicios que cause a "El Municipio" o a terceras personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no sujetarse a lo pactado en este contrato, por inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables; en este caso, los riesgos y la conservación de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a "El Municipio", serán a cargo de "El Contratista".

Si dentro de los doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos por "El Municipio", aparecieren desperfectos o vicios en la obra, "El Contratista", los reparará o repondrá inmediatamente por su propia cuenta, en caso contrario, se hará efectiva la garantía que haya otorgado por este concepto.

Décima Quinta.- Pénas convencionales y retenciones.

"El Municipio", tendrá la facultad de verificar en cualquier momento, si la obra objeto del presente contrato se están ejecutando por "El Contratista", de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "El Municipio", comparará mensualmente los avances de los trabajos con el programa.

Si como resultado de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance físico de los trabajos es menor a lo programado, "El Municipio", procederá a **retener** de cada estimación de trabajo, la cantidad que resulte de multiplicar el **5% (cinco por ciento)**, de la diferencia de los importes programados a erogar mensualmente, por el número de meses transcurridos desde la fecha de incumplimiento del programa, hasta la de revisión, los importes retenidos serán reintegrados a "El Contratista", una vez que éste se regularice con su programa de obra.

Una vez vencido el plazo de ejecución de los trabajos "El Contratista" responsable sin justificación alguna no se llegare a regularizar con su programa de obra y por ende no entregare los trabajos totalmente concluidos en el plazo pactado, no procederá la devolución de los importes retenidos, y se procederá a hacer efectivo a "El Contratista", como **sanción** por incumplimiento de contrato y quedará en favor de "El Municipio".

Si "El Contratista" no concluye la obra en la fecha pactada, como pena convencional deberá cubrir a "El Municipio" la cantidad de 2 (dos) al millar sobre el monto del contrato que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada día calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfacción de "El Municipio" esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

Independientemente de la pena convencional señalada en el párrafo anterior, "El Municipio", podrá optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato o bien dictar la rescisión administrativa del mismo.

El monto máximo de penalización será del **10% (diez por ciento)** del monto total contratado, en caso de rescisión de contrato por incumplimiento de "El Contratista".

En estos supuestos, no se tomaran en cuenta las circunstancias derivadas de caso fortuito o de fuerza mayor.



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SPLOP/FIII 029/2021

Retenciones.- "El Contratista" acepta que "El Municipio" al realizar el pago de las estimaciones, le retenga lo siguiente:

Derechos para la vigilancia, inspección y control de los procesos de ejecución de obra pública de la Contraloría Municipal.	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.
5 AL MILLAR	3%
Previsto en el artículo 76 Penúltimo Párrafo de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.	Previsto en los artículos 63 al 69 de Ley Estatal de Hacienda.

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal previsto en los **artículos del 63 al 69 de la Ley Estatal de Hacienda**, reformada mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado, el **24 de Diciembre del 2019**. "El Municipio" efectuara la retención del tres por ciento; misma que deberá ser plasmada en las facturas de las estimaciones que presente para trámite de pago.

Décima Sexta.- Suspensión temporal del contrato.

"El Municipio" podrá suspender temporalmente en todo o en parte la ejecución de los trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva o incumplimiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, el presente contrato seguirá produciendo todos sus efectos legales.

Décima Séptima.- De la terminación anticipada del Contrato.

"El Municipio" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurren razones de interés general que impidan mantener su vigencia, sin responsabilidad alguna para "El Municipio".

Cuando se surtan alguna de las siguientes causas:

- a).- La imposibilidad de continuar con la ejecución de los trabajos, derivada ésta, por causas de fuerza mayor o caso fortuito.
- b).- La terminación o cancelación de los recursos asignados a la obra objeto del presente contrato, por el ejercicio que corresponda.
- c).- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no sea posible la continuación de los trabajos, "El Contratista", podrá optar por no ejecutarlos, en ese supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato lo solicitará a "El Municipio", quien resolverá dentro de los **veinte (20) días naturales** siguientes al de la recepción de la solicitud; en caso de negativa, será necesario que "El Contratista", obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Décima octava.- Rescisión administrativa del contrato.

"El Municipio" podrá en cualquier momento, rescindir administrativamente el presente contrato por incumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista".



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SPLOP/FIII 029/2021

Son causas de rescisión del presente contrato, las siguientes:

- a).- La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, y demás disposiciones administrativas sobre la materia.
- b).- El incumplimiento de **"El Contratista"**, a cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato.
- c).- Si **"El Contratista"** no inicia los trabajos objeto del presente contrato, en la fecha en que por escrito le señale **"El Municipio"**, o se pacte en el contrato.
- d).- Si **"El Contratista"**, suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazado como defectuoso por **"El Municipio"**.
- e).- Si **"El Contratista"**, no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las ordenes que por escrito le dé **"El Municipio"** y,
- f).- Si **"El Contratista"**, no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de **"El Municipio"**, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

En estos supuestos, las partes convienen que cuando **"El Municipio"** determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando que se cumpla con el procedimiento que se establece en las siguientes fracciones:

- I.- Se notificará fehacientemente a **"El Contratista"** por escrito de los hechos materia de la infracción;
- II.- Se le dará un término de diez días hábiles para que conteste lo que a su derecho convenga, y anuncie y ofrezca pruebas;
- III.- Cumplido lo dispuesto en la fracción anterior se abrirá el término probatorio por quince días hábiles, a efecto de que se lleve a cabo el desahogo de las probanzas, dicho plazo podrá ser prorrogado por cinco días más, cuando así lo requiera la naturaleza de las probanzas de que se trate;
- IV.- Concluido el término probatorio se procederá a dictar la resolución correspondiente, lo cual se hará dentro de los siguientes diez días hábiles; y,
- V.- La resolución emitida deberá ser notificada de manera personal a **"El Contratista"**, o por oficio con acuse de recibo.

Décima Novena.- Modificaciones.

Ambas partes convienen que cualquier modificación a éste contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito mediante la celebración del convenio correspondiente, estos convenios deberán ser autorizados por parte de **"El Municipio"**, bajo la responsabilidad del titular del área responsable de la contratación de los trabajos, en los términos establecidos en el **Artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.

Vigésima.- Normatividad aplicable.

"Las Partes" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

OAXACA

CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SPLOP/FIII 029/2021

establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca** y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Primera.- Jurisdicción y tribunales competentes.

"Las Partes" convienen que todo lo no previsto en el presente contrato, lo resolverán de común acuerdo y conforme a los intereses que cada uno representa y en caso de controversia en su interpretación y cumplimiento, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales del fuero común, con residencia en esta Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo tanto, "El Contratista" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Enteradas "Las Partes" del contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por duplicado al calce y margen, ante los testigos los **Ciudadanos Manuel Alejandro Altamirano Salazar y Gerardo Vásquez Moreno**, con los cargos de **Subdirector de Proyectos y Licitaciones de Obra Pública y Subdirector de Construcción de Obra Pública** de la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente respectivamente, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los **Veinticuatro** días del mes de **Agosto** del año **Dos mil veintiuno**.

"El Municipio"

C. Jorge Castro Campos
Síndico Segundo y
Representante Legal del
Municipio de Oaxaca de Juárez.

C. Alberto Ignacio Orozco Pintos
Director de Desarrollo Urbano,
Obras Públicas y Medio Ambiente.



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

OAXACA

Ciudad Patrimonio
de la Humanidad



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.
SPLOP/FIII 029/2021

"El Contratista"

C. Pedro Rolando López Alavéz
Administrador General Único de
"Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Binlua, S.A. de C.V."




NARCISO MENDOZA 108
JALATLACO OAXACA DE JUAREZ,
OAX. TEL. 951 513 14 12

"Testigos de Asistencia"



C. Manuel Alejandro Altamirano Salazar
Subdirector de Proyectos y
Licitaciones de Obra Pública.

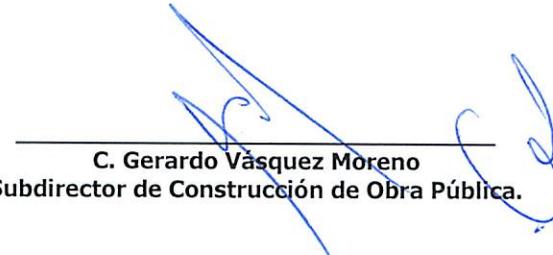

C. Gerardo Vásquez Moreno
Subdirector de Construcción de Obra Pública.



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No. SPLOP/FIII 029/2021

Convenio modificadorio para ampliar el monto del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado numero **SPLOP/FIII 029/2021**, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por el Ciudadano **Jorge Castro Campos** en su carácter de **Síndico Segundo y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez** y el Ciudadano **Alberto Ignacio Orozco Pintos**, Director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente y como testigos los Ciudadanos **Manuel Alejandro Altamirano Salazar** y **Gerardo Vásquez Moreno** con los cargos de **Subdirector de Proyectos y Licitaciones de Obra Pública** y **Subdirector de Construcción de Obra Pública** de la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte la empresa denominada **"Ingeniería y Desarrollo de Proyectos BINLUA, S.A. de C.V."**, representada en este acto por el **C. Pedro Rolando López Alavéz**, en su calidad de **Administrador General Único** a quien en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se le denominará **"El Contratista"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas:

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha 24 de agosto del 2021 **"El Municipio"** y **"El Contratista"**, celebraron el contrato mencionado en el proemio de este convenio, con base en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, mediante el cual **"El Contratista"** se obligó a ejecutar los trabajos descritos en la cláusula primera del mismo, consistentes en la obra pública denominada: **"Repavimentación con concreto hidráulico en la Avenida los Sabinos, Agencia Candiani"** en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro; por un monto de **\$ 2,566,787.87 (Dos millones quinientos sesenta y seis mil setecientos ochenta y siete pesos 87/100 M.N.)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado y con un plazo de ejecución de los trabajos de **60 días naturales**, Contados a partir del día **25 de agosto de 2021**, y con fecha de terminación el día **23 de octubre de 2021**.

II.- La modificación al contrato que se estima necesario, se origina toda vez que a finales del mes de agosto del presente año, como consecuencia de la depresión tropical no. catorce se manifestaron condiciones meteorológicas extraordinarias en el estado y en la ciudad de Oaxaca de Juárez, que dieron inicio a un periodo de lluvias torrenciales que afectaron el proceso de ejecución de los trabajos de la obra iniciada el día 25 de agosto del 2021, denominada "Repavimentación con concreto hidráulico en la avenida los sabinos, Agencia Candiani."; en la primera semana del mes de septiembre del presente año, el temporal de lluvias afectó de forma directa la ejecución de los trabajos, que provocó humedad abundante en el sitio donde se realizó la demolición del pavimento de concreto hidráulico existente, para el 3 de septiembre del año en curso se iniciaron los trabajos de corte del terreno natural, del cual se pudo apreciar que el drenaje pluvial existente se encontraba en malas condiciones; simultáneamente se realizaron los acarrees del material producto de la demolición y del corte, porque las lluvias constantes provocaron en el terreno natural de arcilla plástica una saturación de humedad causando asentamientos en el terreno, debido al arrastre del material fino y exponiendo superficialmente el escombro encontrado



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No. SPLOP/FIII 029/2021

durante el proceso de corte, ya que el flujo de las torrenciales lluvias registradas por las tardes noches también arrastraron la tierra circundante e inundaron el área de trabajo, una vez evaporada se sedimenta y forma una capa fina de lodo en la superficie del terreno, misma que se retiró de forma inmediata para evitar un daño mayor al terreno existente, ya que imposibilita la continuación de los trabajos de afine y compactado del sistema constructivo de la repavimentación que consiste en la demolición del pavimento existente; el acarreo del material producto de la demolición para continuar con el corte del terreno natural, y posteriormente al tener los niveles definidos, se procede a compactar y afinar el terreno, para después suministrar y colocar material de banco mezclado con grava arena, una vez colocado este material se debe compactar para recibir el pavimento hidráulico nuevo. sin embargo y toda vez que el sistema de drenaje pluvial se encuentra en malas condiciones y también se tiene la necesidad de realizar trabajos de rehabilitación de la red de drenaje sanitario y posteriormente la rehabilitación de la red de agua potable, los cuales son servicios primordiales para los vecinos del lugar, mismos que deben dejarse en un funcionamiento óptimo antes de realizar la pavimentación de la calle; considerando la afectación producida por las lluvias en el área de trabajo, obliga a la residencia de la obra a solicitar a la contratista un muestreo del terreno natural existente para determinar la calidad del mismo, así como el análisis de los materiales pétreos e industrializados para la integración de la subbase; resultados que fueron entregados a esta residencia para indicar el criterio constructivo adecuado, por lo que fue necesaria la suspensión de la obra antes citada para la ejecución de las obras referidas.

Atendiendo a lo anterior se efectuó una revisión técnica más detallada al drenaje pluvial haciendo constar que en su mayoría se encuentra azolvado y con un criterio constructivo deficiente sin el funcionamiento adecuado y con rejillas pluviales chicas de tipo boca de tormenta completamente azolvadas, por lo que es prioritaria la sustitución de la tubería, la construcción de rejillas pluviales con mayores dimensiones y la construcción de registros para la limpieza y desazolve del mismo; por otra parte y al contarse con los resultados del laboratorio se concluye que el terreno natural es de tipo limo arcilloso color negro con una clasificación en el sistema unificado de clasificación de suelos (limo baja plasticidad ó ml); por lo que se requiere retirar una mayor sección del terreno natural y sustituirlo con material de banco con características de subrasante para garantizar la estructura del pavimento.

Por tal motivo y como consecuencia de la revisión efectuada por el personal del Municipio de Oaxaca de Juárez, el Comité de la obra integrado por el Municipio de Oaxaca de Juárez para la supervisión y vigilancia de los trabajos y personal de la Agencia Municipal; con la finalidad de que la obra amparada mediante el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número SPLOP/FIII 029/2021 se concluya de manera satisfactoria, cumpliendo con las metas del proyecto para entregar una obra que cumpla con las necesidades de los usuarios y con la utilidad que la ciudadanía requiere; es necesario realizar trabajos con cantidades adicionales de trabajo en los conceptos del catálogo existentes en las partidas: cortes y afines, pavimento, limpieza y acarreos y conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente

III.- Con fecha catorce de septiembre del año dos mil veintiuno, se suscribió el acta de suspensión de la obra, misma que fue reiniciada el día veintitrés de octubre del año en curso, una vez que se tuvieron las condiciones para su continuación, lo que ocasionó la necesidad de prorrogar el periodo del contrato, el cual quedó comprendido del veintitrés de octubre del año



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No. SPLOP/FIII 029/2021

dos mil veintiuno al dos de diciembre del año dos mil veintiuno, en los que se incluyen los días restantes del plazo que le fue concedido a la contratista en el contrato de referencia, para que estuviera en condiciones de cumplir con la ejecución de los trabajos que le fueron encomendados.

IV.- Con fecha veintitrés de octubre del año dos mil veintiuno, se tuvo la necesidad de formular el Dictamen Técnico en el que se plasmó la justificación técnica por la que se estimó necesario ampliar el monto del contrato original con el propósito de que la obra que le fue encomendada a la empresa denominada "INGENIERÍA Y DESARROLLOS DE PROYECTOS BINLUA S.A. DE C.V." se ejecute en su totalidad y que cumpla con las necesidades de los habitantes del lugar que les brindará mejores condiciones de vida y se abatirán sus condiciones de rezago social.

V.- El día tres de noviembre del año dos mil veintiuno, se suscribió el Acuerdo Administrativo por el que se determina la celebración de un Convenio Modificadorio para Ampliar el Monto del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo determinado número SPLOP/FIII 029/2021 de la Obra denominada "**Repavimentación con concreto hidráulico en la Avenida los Sabinos, Agencia Candiani**" Ejercicio Fiscal 2021.

VI.- Atendiendo a los antecedentes y a la necesidad que se tiene para ejecutar trabajos con cantidades adicionales y conceptos de trabajo adicionales en el lugar donde se contempló la ejecución de la obra de mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, es necesario celebrar un convenio modificadorio para ampliar el monto al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **SPLOP/FIII 029/2021** de la obra denominada: "**REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA LOS SABINOS, AGENCIA CANDIANI**" en cantidad de **\$627,575.27 (SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N.) IVA incluido**, cantidad que representa al **24.44 %** con relación al monto contratado, necesarios para la ejecución de los trabajos con cantidades adicionales y conceptos de trabajo adicionales, que permitan cumplir con las metas del proyecto, los cuales se ejecutaran dentro del plazo prorrogado que le fue autorizado a la empresa contratista; por tal motivo se emiten las siguientes:

DECLARACIONES:

I.- Declara "El Municipio"

I.1.- Que "**El Municipio**" suscribe el presente convenio a través del **Ciudadano Jorge Castro Campos** en su carácter de **Síndico Segundo y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez**, quien está facultado para obligarse y comprometerse en los términos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número SPLOP/FIII 029/2021, de acuerdo a lo previsto por los artículos 71 fracción XXI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y 55 fracción XII del Bando de Policía Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez; acreditando su personalidad con el Acta de Sesión Solemne de Cabildo celebrada por el Honorable Cabildo Municipal el día uno de enero del año dos mil diecinueve y el **Ciudadano Alberto Ignacio Orozco Pintos, Director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente** y



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No. SPLOP/FIII 029/2021

actuando como testigos los Ciudadanos Manuel Alejandro Altamirano Salazar y Gerardo Vásquez Moreno con los cargos de Subdirector de Proyectos y Licitaciones de Obra Pública y Subdirector de Construcción de Obra Pública de la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente respectivamente.

I.2.- Que existe la necesidad de modificar las condiciones inicialmente pactadas en el contrato de la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número SPLOP/FIII 029/2021 denominada: "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA LOS SABINOS, AGENCIA CANDIANI", por lo que "El Municipio" considera necesario ejecutar trabajos con cantidades adicionales y conceptos de trabajo adicionales en el proyecto, los cuales se describen en los siguientes términos:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.1	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA LOS SABINOS, AGENCIA CANDIANI.				
102	CORTES Y AFINES				
18PAVAS-300RTR	CORTE EN CAJA SOBRE BASE HIDRÁULICA O SUB BASE HIDRÁULICA DAÑADA, CON RETROEXCAVADORA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE A PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS.	M3	231.17	\$213.14	\$ 49,271.57
			TOTAL CORTES Y AFINES		\$ 49,271.57
103	PAVIMENTO				
20-DSRC-004-B	SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL, PARA BASE HIDRÁULICA CON MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA) CARACTERÍSTICAS DE UN 20 % DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO, 80% DE MATERIAL TIPO GRAVA ARENA, AL 95 % DE PVS.M. INCLUYE: AGUA PARA COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	231.17	\$933.08	\$ 215,700.10
			TOTAL PAVIMENTO		\$ 215,700.10
106	LIMPIEZA Y ACARREOS				
DSLA-002	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR	M3	335.20	\$143.35	\$48,050.92
			TOTAL LIMPIEZA Y ACARREOS		\$48,050.92
	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS				
EXT-001	REJILLA PLUVIAL DE 5.50 MTS X 0.70 MTS A BASE DE VIGA IPR 4"x4" (ESPESOR DE ALMA DE 7.1 MM), ELABORADA A BASE DE LOSA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. ARMADA CON ACERO DEL NO. 3 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CASTILLOS DE 15X15 CMS. CON 4 PZAS EN EL SENTIDO LARGO DE LA REJILLA CON UN F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS, MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN 10X14X28 JUNTEADO CON CEMENTO-ARENA PROP 1:4; CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X25 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS, CON UN F'C= 200 KG/CM2. APLANADO INTERIOR A BASE DE CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3; CHAFLÁN DE 10 CMS A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3; LA REJILLA SERA ELABORADA A BASE DE VIGAS IPR, 4 PZAS EN EL SENTIDO MÁS LARGO, 6 PZAS EN EL SENTIDO MÁS CORTO Y SOLERA DE 2"X 1/8". INCLUYE: ARENERO DE 0.60 X 0.35 CMS DE PROFUNDIDAD ARMADO JUNTO CON LA LOSA, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	2.00	\$ 72,733.94	\$ 145,547.88
EXT-002	REJILLA PLUVIAL DE 4.00 MTS X 0.70 MTS A BASE DE VIGA IPR 4"x4" (ESPESOR DE ALMA DE 7.1 MM), ELABORADA A BASE DE LOSA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. ARMADA CON ACERO DEL NO. 3 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CASTILLOS DE 15X15 CMS. CON 3 PZAS EN EL SENTIDO LARGO DE LA REJILLA CON UN F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON 4	PZA	1.00	\$ 60,478.09	\$ 60,478.09



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No. SPLOP/FIII 029/2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS, MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN 10X14X28 JUNTEADO CON CEMENTO-ARENA PROP 1:4; CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X25 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS, CON UN F'C= 200 KG/CM2. APLANADO INTERIOR A BASE DE CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, CHAFLÁN DE 10 CMS A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3; LA REJILLA SERA ELABORADA A BASE DE VIGAS IPR, 4 PZAS EN EL SENTIDO MÁS LARGO Y 5 PZAS EN EL SENTIDO MÁS CORTO, SOLERA DE 2"X 1/8". INCLUYE: ARENERO DE 0.60 X 0.35 CMS DE PROFUNDIDAD ARMADO JUNTO CON LA LOSA, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
EXT-003	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE TRANSICIÓN DE 0.40 X 0.60 (MEDIDAS INTERIORES) Y DE 0.40 MTS, DE PROFUNDIDAD INTERIOR, A BASE DE MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS. DE ESPESOR, ACABADO INTERIOR PULIDO, INCLUYE: LOSA TAPA DE 0.70X0.90X0.10 DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS DE 3/4" A CADA 20 CMS. EN AMBOS LADOS FC= 200 KG/CM2, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR F C= 150 KG/CM2; APLANADO INTERIOR, FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA. MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	\$ 5,491.15	\$ 21,964.60
SUBTOTAL EXTRAORDINARIOS					\$ 227,990.57
SUBTOTAL					\$ 541,013.16
I.V.A.					\$ 86,562.11
TOTAL					\$ 627,575.27

I.3.- Que los trabajos materia de este convenio ascienden a la cantidad **\$627,575.27 (Seiscientos veintisiete mil quinientos setenta y cinco pesos 27/100 M.N.)** este monto incluye el impuesto al valor agregado, como lo manifiesta el Acuerdo Administrativo de fecha tres de noviembre del año dos mil veintiuno, en el que se determina la celebración de un Convenio Modificatorio para ampliar el monto del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo determinado número **SPLOP/FIII 029/2021**, de la obra denominada **"REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA LOS SABINOS, AGENCIA CANDIANI"** por lo cual el Ciudadano Víctor César Vásquez Bocanegra, Tesorero Municipal, emitió el oficio de ampliación del ejercicio de los recursos número **TM/SECP/DSI/AM/005/2021** de fecha tres de noviembre del año dos mil veintiuno, con Apertura Programática **2.- Desarrollo Social, 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad y 2.2.1. Urbanización**, afectando la Clave Presupuestal número **31111-20310-22112-10500105K121-61412-2-2533321**.

II.- Declara "El contratista"

II.1.- Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, que tiene suficiente capacidad jurídica, que dispone de la organización y los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones contraídas.

II.2.- Que el ciudadano **Pedro Rolando López Alavéz** en su carácter de **Administrador General Único** tiene reconocida su personalidad en el numeral II de las declaraciones del contrato original firmado por las partes, acreditando su identidad en



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No. SPLOP/FIII 029/2021

este acto con su credencial para votar con fotografía con número folio **0549064442786** expedida por el Instituto Nacional Electoral.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera: El objeto del presente convenio, tiene como finalidad establecer las bases, términos y condiciones bajo las cuales "El Municipio" y "El Contratista" modifican el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de número SPLOP/FIII 029/2021, de fecha **24 de agosto de 2021**, cuyo objeto es la ejecución de los trabajos de la obra denominada: "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA LOS SABINOS, AGENCIA CANDIANI" en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro.

Segunda: Las partes establecen que del contrato inicialmente celebrado "El Contratista" ejecutará las partidas incluidas en el mismo sin ninguna modificación **salvo las expresadas de este convenio**.

Tercera: Las partes acuerdan en que "El Municipio" pagará los trabajos con cantidades adicionales y conceptos de trabajo adicionales materia del presente convenio de la obra denominada: "REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA LOS SABINOS, AGENCIA CANDIANI", correspondientes a las siguientes partidas: **CORTES Y AFINES** con clave: 18PAVAS-300RTR; **PAVIMENTO** con clave: 20-DSRC-004-B; **LIMPIEZA Y ACARREOS** con clave: DSLA-002 y **CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS** con claves: EXT-001, EXT-002 y EXT-003; las cuales han sido descritas en el presente instrumento legal. Por esta razón y con la finalidad de poder concluir de forma satisfactoria los trabajos encomendados se requiere de una modificación al contrato de referencia para ejecutar las cantidades adicionales de los trabajos y conceptos de trabajos adicionales, asignados en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, según especificaciones adicionales a la obra antes mencionada, que se describen en el presupuesto de obra y en el programa calendarizado de erogaciones presentados por "El Contratista" y avalado por "El Municipio" y el cual forma parte íntegra del presente instrumento.

Cuarta. - La ampliación de los recursos se autoriza en cantidad de **\$627,575.27 (Seiscientos veintisiete mil quinientos setenta y cinco pesos 27/100 M.N.)** incluye el impuesto al valor agregado y que serán destinados para la realización de trabajos con cantidades adicionales y conceptos de trabajo adicionales al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número SPLOP/FIII 029/2021.



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No. SPLOP/FIII 029/2021

Quinta.- Las partes establecen que “El contratista” ejecutará los trabajos encomendados en la cláusula anterior dentro del periodo prorrogado comprendido del 05 de noviembre del año 2021 al día 02 de diciembre del año 2021 en el que incluyen los días restantes del contrato que le fueron otorgados a la empresa contratista de referencia, originado por la suspensión de los trabajos de fecha catorce de septiembre del año dos mil veintiuno, en los términos que el contrato original establece a entera satisfacción del “El Municipio”.

Sexta. - “El Contratista” se obliga a entregar debidamente endosada a favor del Municipio de Oaxaca de Juárez una ampliación de la fianza de cumplimiento estipulada en el contrato de obra SPLOP/FIII 029/2021, en los términos del artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la cual será cancelada una vez que se haya ejecutado en su totalidad los trabajos objeto del presente convenio y “El Municipio” los reciba a su entera satisfacción.

Sexta. - Las partes están enteradas y de acuerdo en que quedan vigentes todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el contrato original número SPLOP/FIII 029/2021 de fecha 24 de agosto del 2021, en todo lo que no se oponga el presente convenio, debiendo mantenerse los precios unitarios considerados en el contrato original.

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por duplicado al calce y margen, ante los testigos los Ciudadanos Manuel Alejandro Altamirano Salazar y Gerardo Vásquez Moreno con los cargos de Subdirector de Proyectos y Licitaciones de Obra Pública y Subdirector de Construcción de Obra Pública de la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente respectivamente, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.

“El Municipio”

C. Jorge Castro Campos
Síndico Segundo Municipal y
Representante Legal del
Municipio de Oaxaca de Juárez.

